


ESTADO DE ALIVIADOR Y BYPASS AL LUNES 27 DE ABRIL

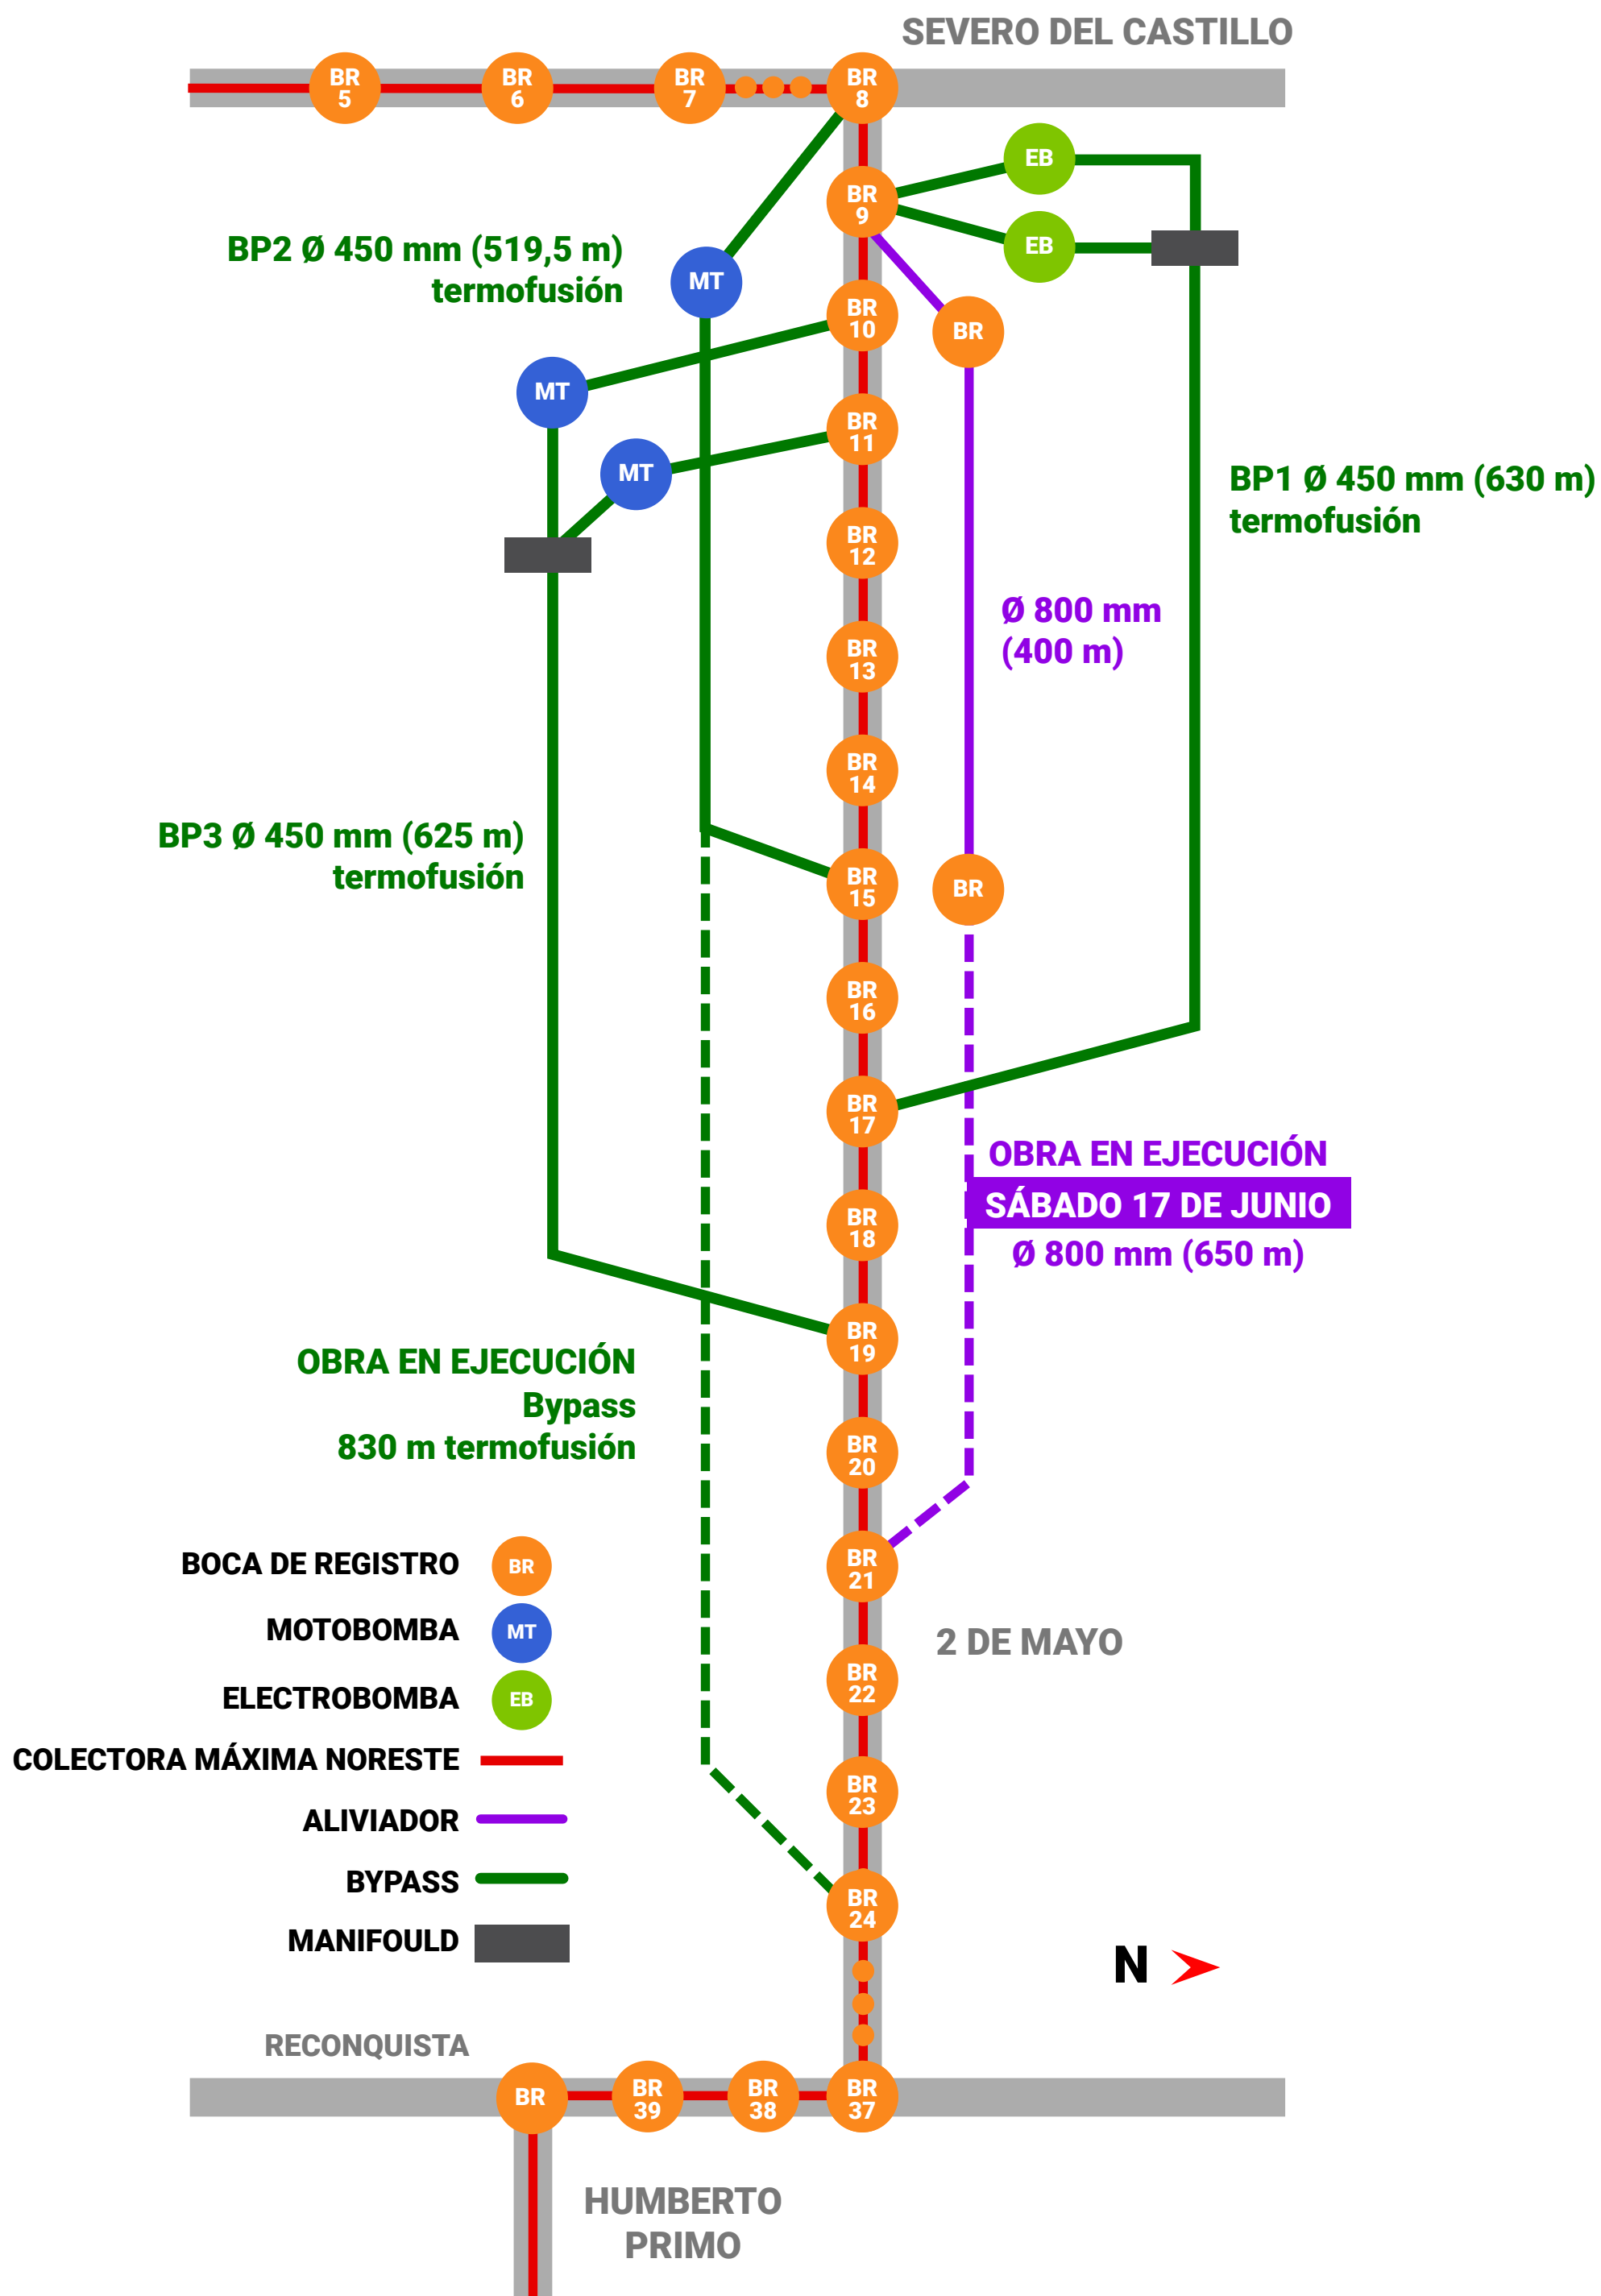

ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS DE CORTO PLAZO EN SEVERO DEL CASTILLO Y 2 DE MAYO

Lunes 27 de abril

Se continúan los trabajos de la **segunda etapa del aliviador cloacal en calle 2 de Mayo, Guaymallén.**

Esta obra es fundamental para optimizar el sistema de saneamiento de la zona y consiste en la construcción de un colector cloacal en cañería de PRFV RN 5000 N/m², cuyo diámetro nominal (DN) es de 800 mm. Funcionará como aliviador de la Colectora Máxima en un tramo que va desde calle 2 de Mayo, al este de calle Severo del Castillo.

Con una longitud que alcanzará los 650 m y un plazo de obra de 60 días corridos, el colector se ubicará desde Boca de Registro (BR) N°14 a Boca de Registro (BR) N°21.

Para minimizar las molestias a los vecinos y no entorpecer el tránsito vehicular ni el transporte público de pasajeros, **está prevista una excavación de 1,8 m de ancho y 2,5 m de profundidad que ocupará media calzada**, por lo cual se deberá circular con precaución. Durante el desarrollo de la obra pueden haber cortes intermitentes de tránsito, por movimientos de equipos pesados.

ZONAS DE TRABAJO

Entre BR N°14 a BR N°15, se trabajará por la calzada Norte.
Desde BR N°15 a BR N°21, los trabajos se realizarán por calzada Sur.

MONTO DE INVERSIÓN

USD 293.724,92

LONGITUD

Aliviador nuevo: 650 m / Total del aliviador: 1.050 m

PLAN DE AVANCE DE LOS TRABAJOS

ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA

TAREAS		13/04/2026	15/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	10/06/2026	17/06/2026
TAREAS PRELIMINARES												
ZONA DE TRABAJO	BR 21											
	BR 20											
	BR 19											
	BR 18											
	BR 17											
	BR 16											
	BR 15											
	BR 14											
NUEVAS BR	BR 21'											
	BR 20'											
	BR 17'											
	BR 16'											

